

Afronding inrichting De Laantjes en De Straatjes

De belangrijkste nog uit te voeren werkzaamheden in De Laantjes en De Straatjes worden in onderstaande planning gegeven. De genoemde nummers (1 t/m 10) verwijzen naar de tekening die daaronder is bijgevoegd.

Week 42 t/m 45 (Nummer 1):

Het realiseren van de 'boenstoep' (ouderwetse wasplaats) aan de Tuinder. Er wordt gestart met het tijdelijk dempen van de sloot. Hierna zal de betonconstructie worden gemaakt in de teen van het talud. Na de werkzaamheden zal het definitieve straatwerk worden aangebracht.

Week 43 en 44 (nummer 5):

De huidige gronddepotruimte wordt ontmanteld en de nieuwe waterpartij wordt gegraven. Een deel van de grond blijft gehandhaafd om zo in het midden van de watergang een eiland te creëren waar in een later stadium een definitieve invulling aan wordt gegeven.

Week 45 t/m 47 (nabij nummer 3):

Werkzaamheden aan de bestrating t.h.v. Ijdenhove/ Platglas

Week 46 (Nummer 4):

Het definitief inrichten van het Appellaantje (Scheepssloper). De tijdelijke parkeerstrook wordt opgebroken. Het talud naar de watergang wordt opnieuw geprofileerd en er wordt een wandelpad aangelegd met halfverharding. Tevens zal op de meest oostelijke locatie een basis voor de nieuwe speeltuin worden aangebracht.

De groenwerkzaamheden zullen na het aanbrengen van de grond en halfverharding worden opgepakt. Dit zal voor de jaarwisseling gereed zijn. Voor de speeltuin is het vooruitzicht dat deze in maart/ april van 2026 gereed zal zijn.

Week 47 t/m 49 (Nummer 2):

Definitief inrichten woonomgeving project 'Morning!' nabij de rotonde.

Week 47 t/m 51 (nummer 3):


Het definitief inrichten van de verkeersverbinding Tuinder/ Hark. Deze werkzaamheden zullen gevolgen hebben voor de bereikbaarheid van zowel De Straatjes als De Laantjes. Door middel van vooraankondigingen zal u hierover nader worden geïnformeerd.


Week 4 t/m 8 (nummer 7 en 8):

Het aanbrengen van de definitieve verharding op de Hark/ Tuinder/ Rtonde Jacobuslaan. Deze werkzaamheden zullen gevolgen hebben voor de bereikbaarheid van zowel De Straatjes als De Laantjes. Door middel van vooraankondigingen zal u hierover nader worden geïnformeerd.

Nummer 6, 9 en 10:

De uitvoering van de resterende werkzaamheden (het aanbrengen van de definitieve verharding) is afhankelijk van de snelheid van de bouw van de laatste woningen nabij deze locaties. De woningen van het project 'De Kantonniers' worden Q4 2025 opgeleverd. De verwachting is dat de woningen van het project 'De Drie Watermeesters' medio april 2026 zullen worden opgeleverd.

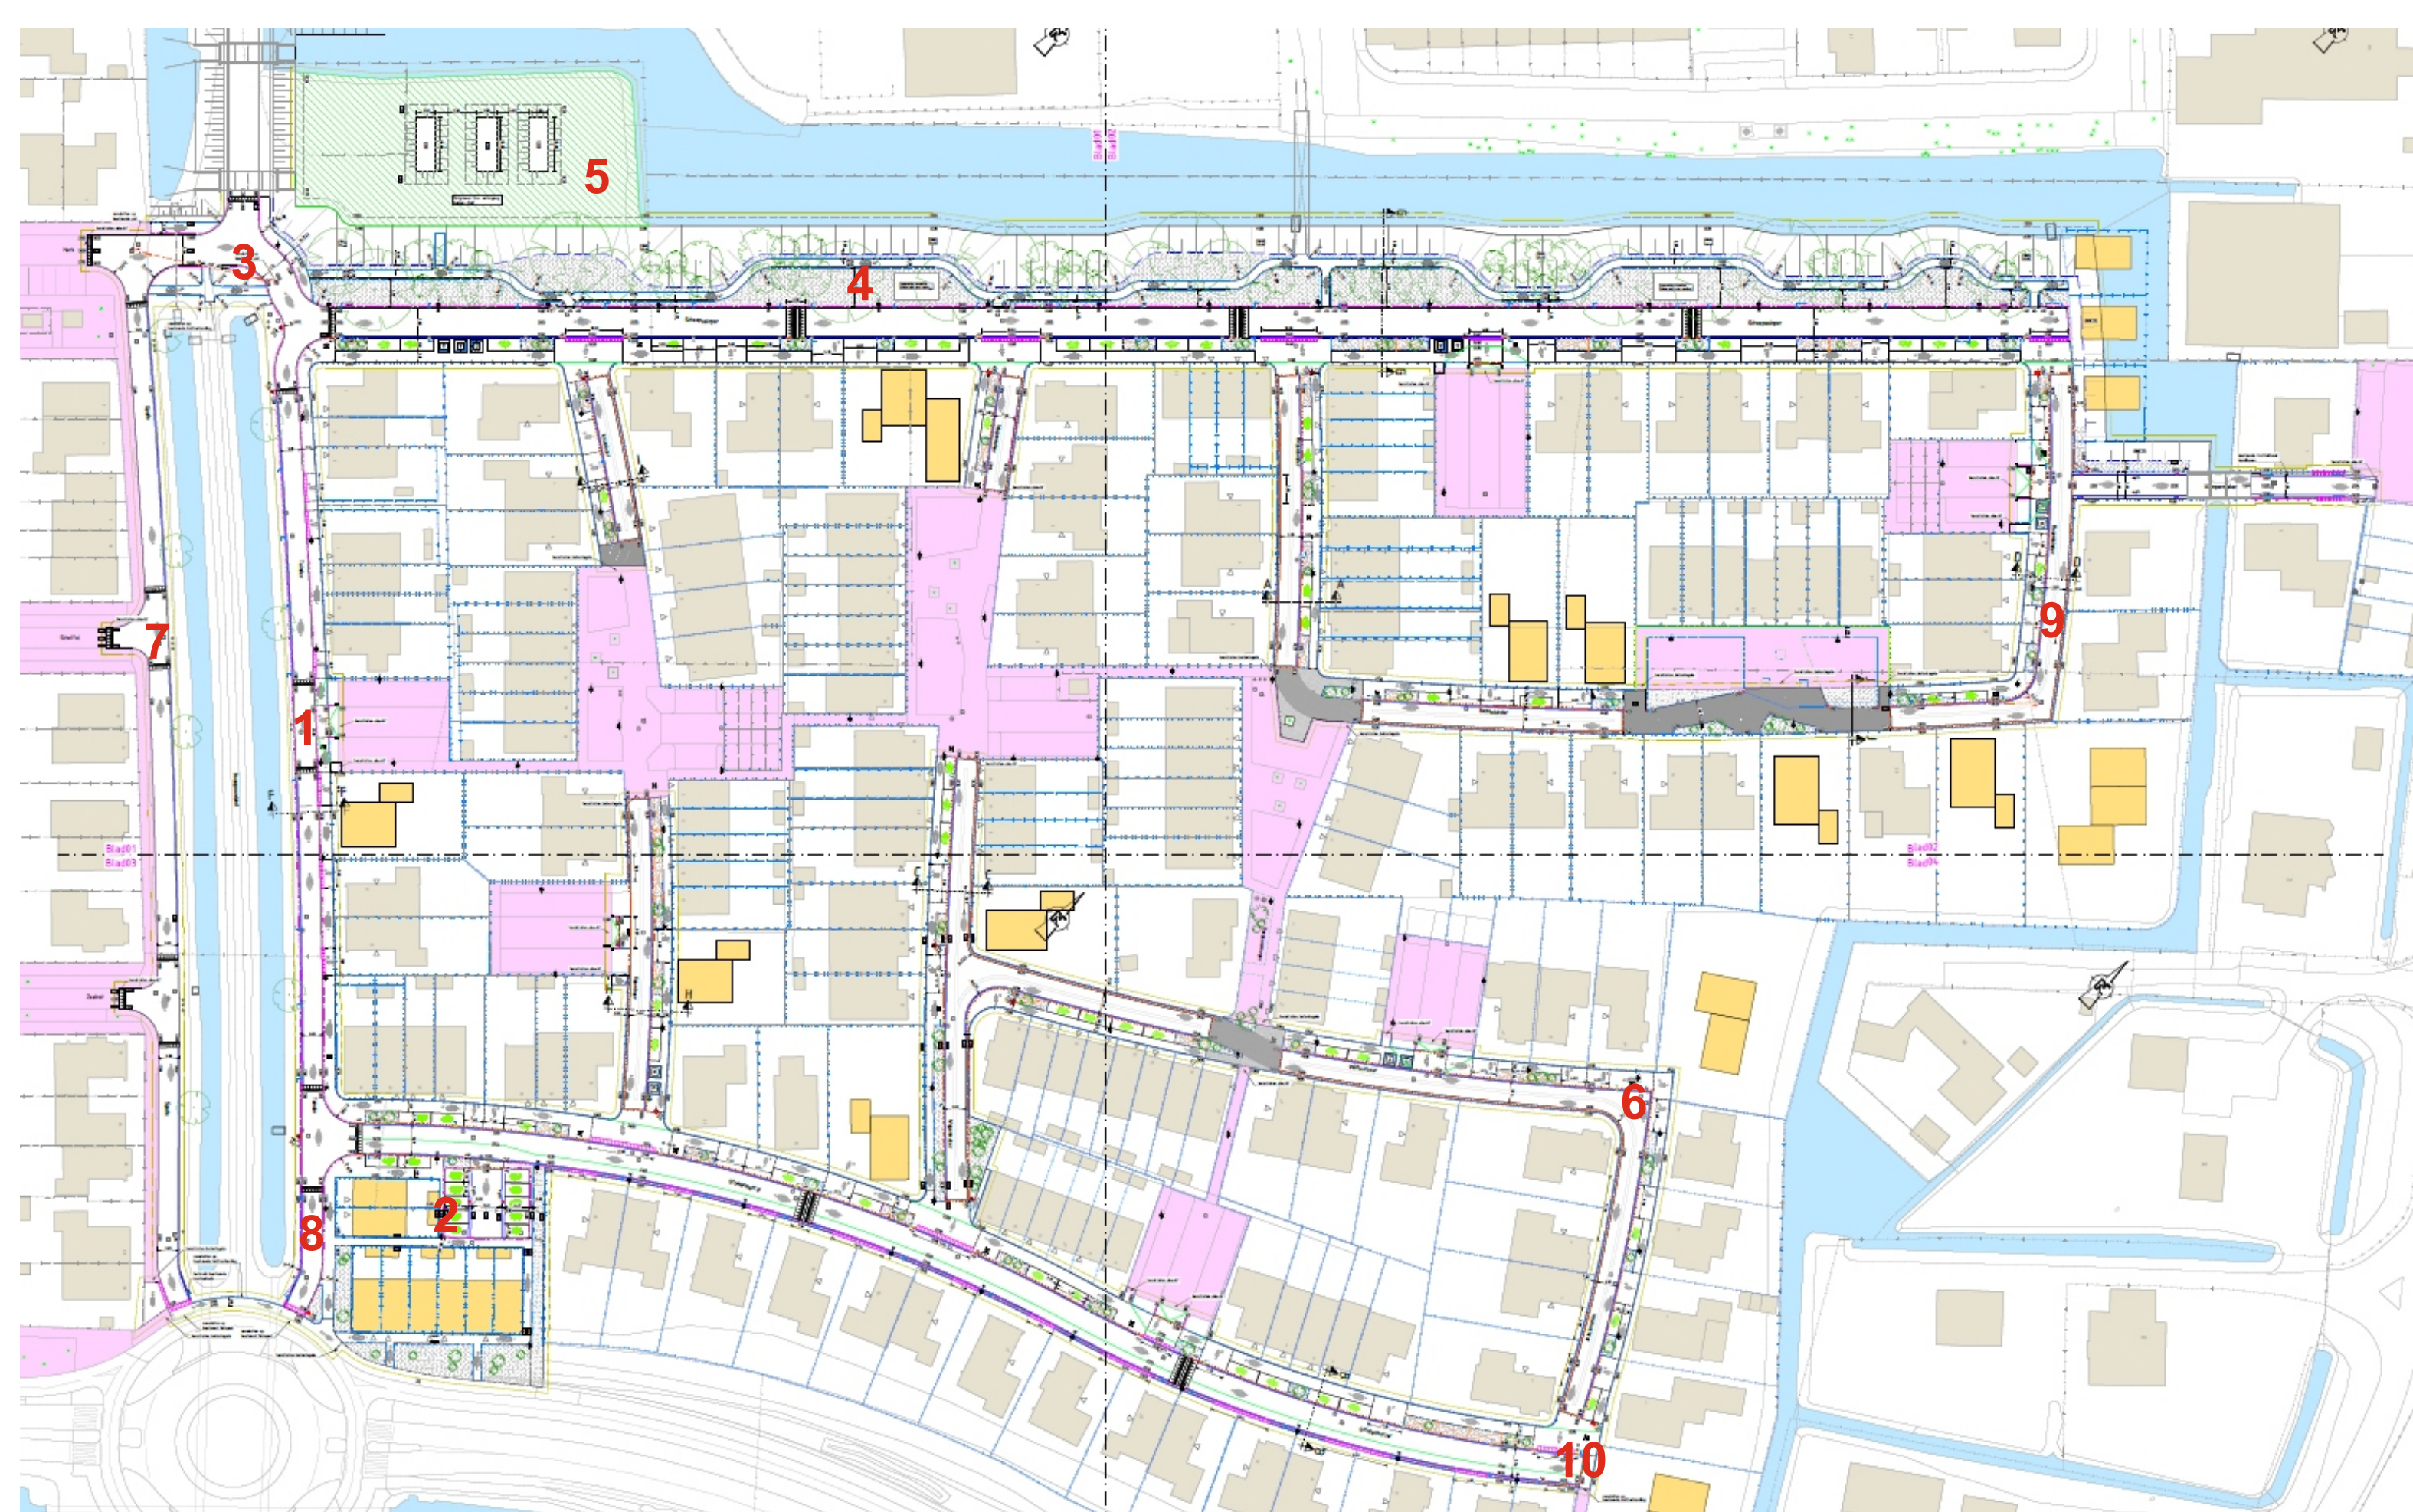



 Ligchaam Bestratingen B.V.
 overige
 vakantie / feestdag
 afsluiting Hark C1

[illegible]
