

## **Afronding inrichting De Laantjes en De Straatjes**


De belangrijkste nog uit te voeren werkzaamheden in De Laantjes en De Straatjes worden in onderstaande planning gegeven. De genoemde nummers (1 t/m 10) verwijzen naar de tekening die daaronder is bijgevoegd.

### **De Laantjes:**

- Definitieve aanleg Spade is afgerond (7)

### **De Straatjes:**

- Week 12/13: woonrijpmaken rotondewoningen (2)  
Na oplevering van de woningen zal de openbare ruimte hier volgens het IPOR worden ingericht.
- Week 14: definitieve aanleg kruising Platglas-Hark (3)  
Omdat het verwijderen van de duiker onder de Hark/ Platglas door dieper en verder lag dan van tevoren gedacht is er gekozen om dit eerst tijdelijk dicht te straten om de grond te laten zetten. Nu de grond enigszins is gezet kan de definitieve bestrating worden aangebracht.
- Week 18: definitieve aanleg Tuinder vanaf rotonde en kruising met Stoelenmatter (8)
- Tussentijds definitieve aanleg gedeelte Bezembinder tot Klompenmaker en de bruggen langs de dubbele wetering (1 en 9)
- Het Appellaantje wordt momenteel ingericht. De 2 speelplekken zullen in april worden aangebracht (4)
- In het midden van de watergang is een eiland gecreëerd, waar in een later stadium een definitieve invulling aan wordt gegeven (5)
- De uitvoering van de resterende werkzaamheden (het aanbrengen van de definitieve verharding) is afhankelijk van de snelheid van de bouw van de laatste woningen nabij deze locaties. Bij nummer 6 is de definitieve verharding inmiddels aangebracht (6 en 10)

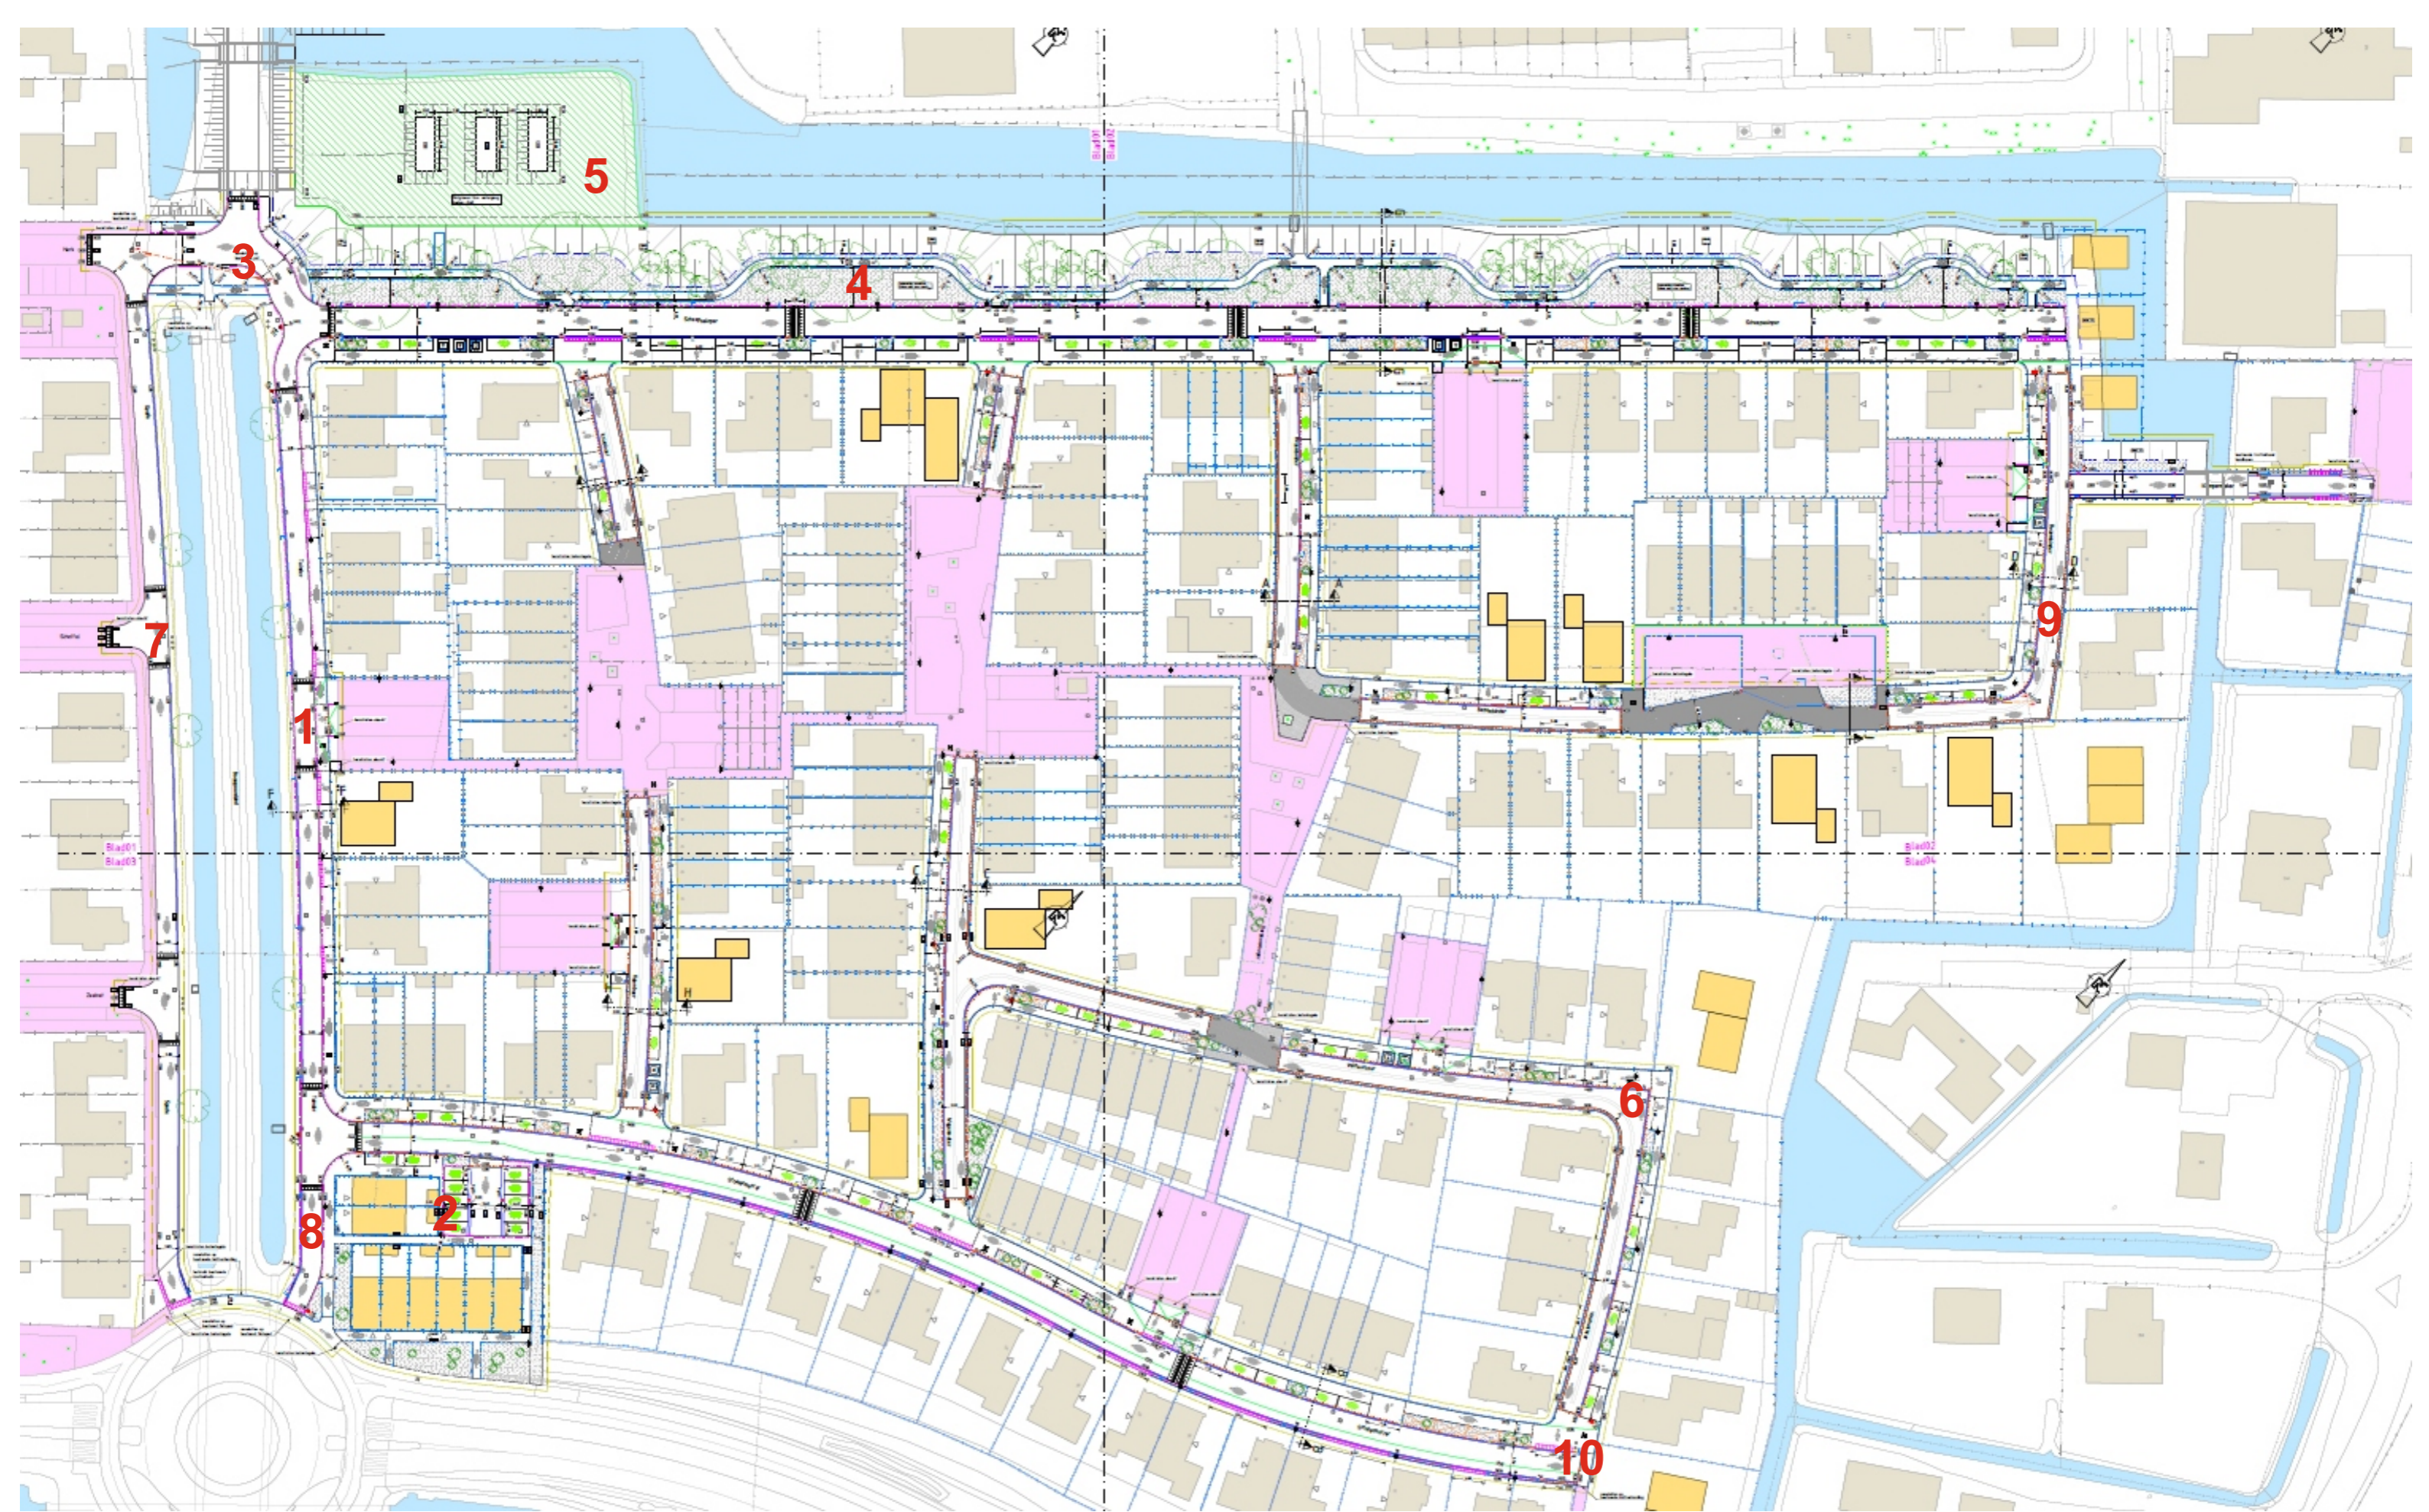

5

4

3

9

1

6

10

2

8

7
